



TRANSFORMANDO
GUERRERO
DESARROLLO URBANO
OBRAS PÚBLICAS Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACATEPEC GUERRERO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PROGRAMA: PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES

INFORME FÍSICO – FINANCIERO TRIMESTRAL



005705



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE ACATEPEC, GRO.
2021-2024**



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO TRIMESTRAL

Acatepec, Gro., a 30 de junio de 2022

C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel
Secretaria de la SDUOPOT
PRESENTE

EL QUE SUSCRIBE C. ROMOALDO DIAZ ROSAS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACATEPEC GUERRERO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **PRIMER TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO)** DEL CAMINO DENOMINADO: **CRUCERO MIRADOR - EL MIRADOR**, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 0+720, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÀULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA**, FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: (1) MUROS DE CONTENCIÓN Y (280) ML DE GUARNICION CONCLUIDOS, TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 0.180 KM, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
0.72 KM	0.180 KM	25	2,940,000.00	1,762,236.00	1,159,617.72	39

Izquierda			Empedrado Central	Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
180	180	180		180	180	180

PRESIDENCIA
C. ROMOALDO DIAZ ROSAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
 DISTRITO JUDICIAL DE MORELOS

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ CUEVAS
SUPERVISOR DE OBRA

005706



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2012



SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS Y
CRECIMIENTO TERRITORIAL
DEL ESTADO DE GUERRERO

LARGUILLO DE AVANCE FISICO

Formato
6



Estado: **GUERRERO** Municipio: **ACATEPEC**

Nombre del Camino: **CRUCERO EL MIRADOR-MIRADOR**


Tramo: **0+000-0+720**

Longitud Total: **0.72 KM**

Mezcla: **0.72 KM**

Ancho de Corona: **5 METROS**

Fecha de reporte: **jun-22** Hoja: **1** de **1**




AVANCE PROMEDIO DE LA SEMANA: **50 METROS.**

MANO DE OBRA PROMEDIO SEMANAL: **14 PERSONAS.**

SIMBOLOGIAS

- GUARNICION
- ALCANTARILLAS
- MUROS DE CONTENCIÓN
- CUNETAS
- RODERAS
- EMPEDRADO
- SEÑALAMIENTOS
- DEFENSA METALICA
- OTROS

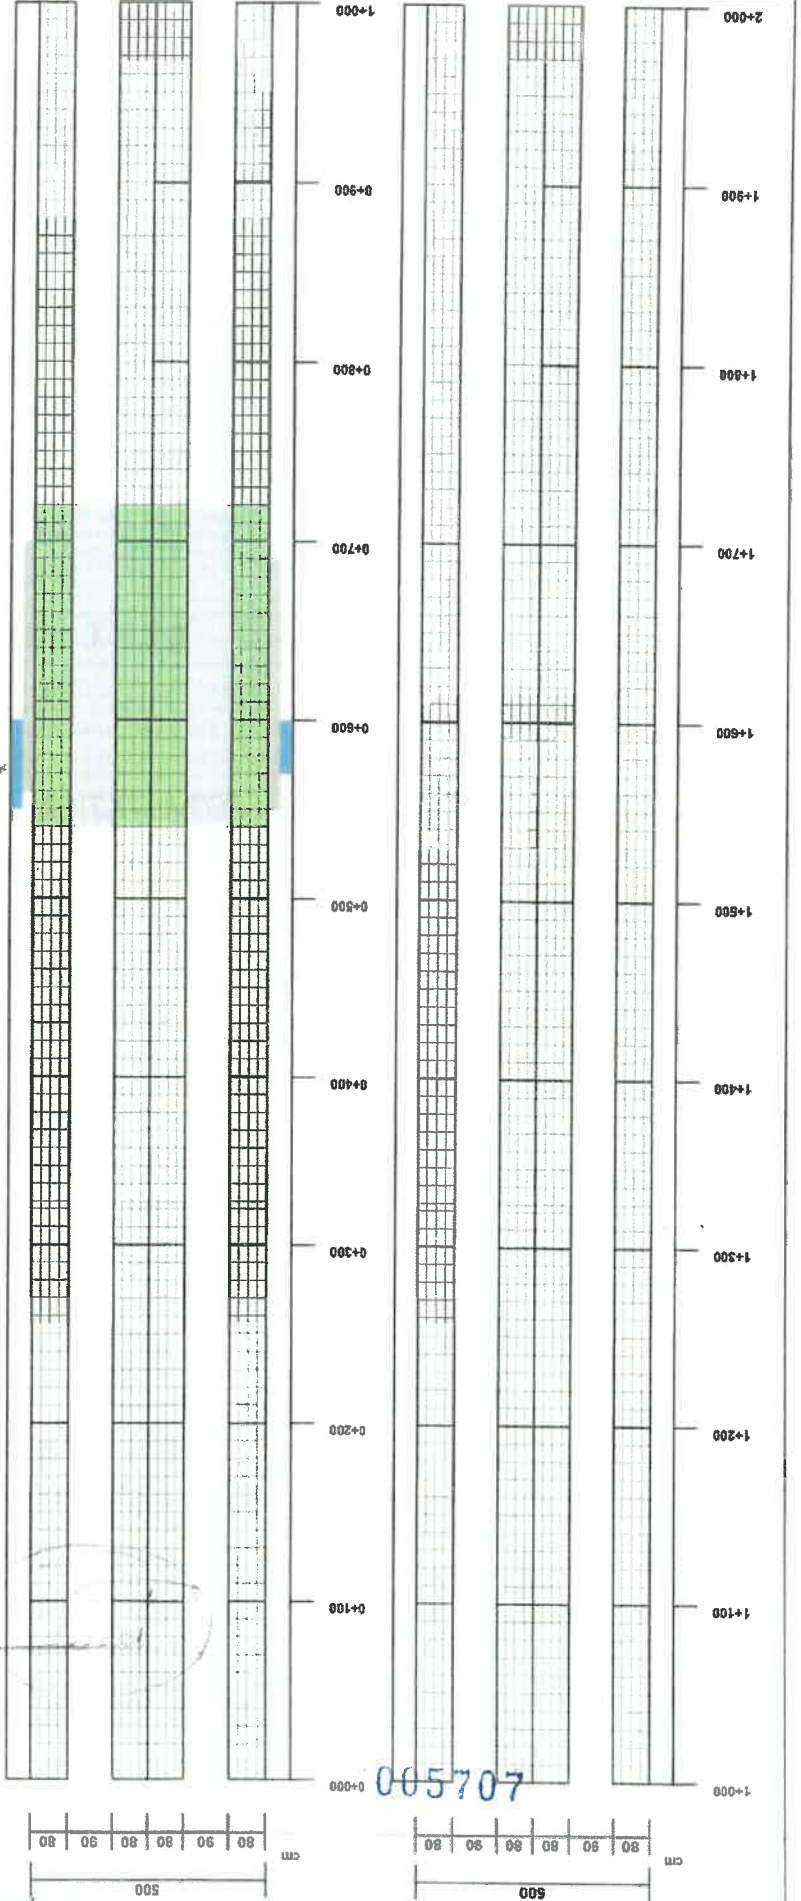

005707
