



TRANSFORMANDO
GUERRERO
CONSTRUYENDO PARA EL FUTURO
2018 - 2022

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACATEPEC GUERRERO

SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DEL ESTADO DE GUERRERO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PROGRAMA: PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS ARTESANALES

INFORME FÍSICO – FINANCIERO TRIMESTRAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACATEPEC, GRO. 2021-2024



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO TRIMESTRAL

Acatepec, Gro., a 30 de septiembre de 2022

C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel
Secretaria de la SDUOPOT
PRESENTE

EL QUE SUSCRIBE C. ROMOALDO DIAZ ROSAS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACATEPEC GUERRERO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **SEGUNDO TRIMESTRE (JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE)** DEL CAMINO DENOMINADO: **BUENA VISTA - XILOTLANCINGO**, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 5+980, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÀULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÒN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA**, FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: 3 ALCANTARILLAS, 8 MUROS, 2820 ML DE CUNETAS CONCLUIDOS, TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 2.9 KM, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
5.98 KM	2+900 KM	48	24,500,000.00	14,685,300.00	2,621,747.32	38

Izquierda			Empedrado Central	Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
2900	2900	2900		2900	2900	2900

ATENTAMENTE

C. ROMOALDO DIAZ ROSAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. NAHUN EDUVIGES MACEDA
SUPERVISOR DE OBRA



TRANSFORMANDO
GUERRERO
COMUNIDAD DEL ESTADO
2021 - 2023



SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DEL ESTADO DE GUERRERO

LARGUILLO DE AVANCE FISICO

Formato
6



Estado: **GUERRERO** Municipio: **ACATEPEC**

Nombre del Camino: **BUENAS VISTA-XILOTLANCINGO**


Tramo: **0+000 -5+980**

Longitud Total : **5.98 KM**

Meta: **5.98 KM**

Ancho de Corona : **5 y 6 METROS**

Fecha de reporte: **sep-22** Hoja: **1** de **2**


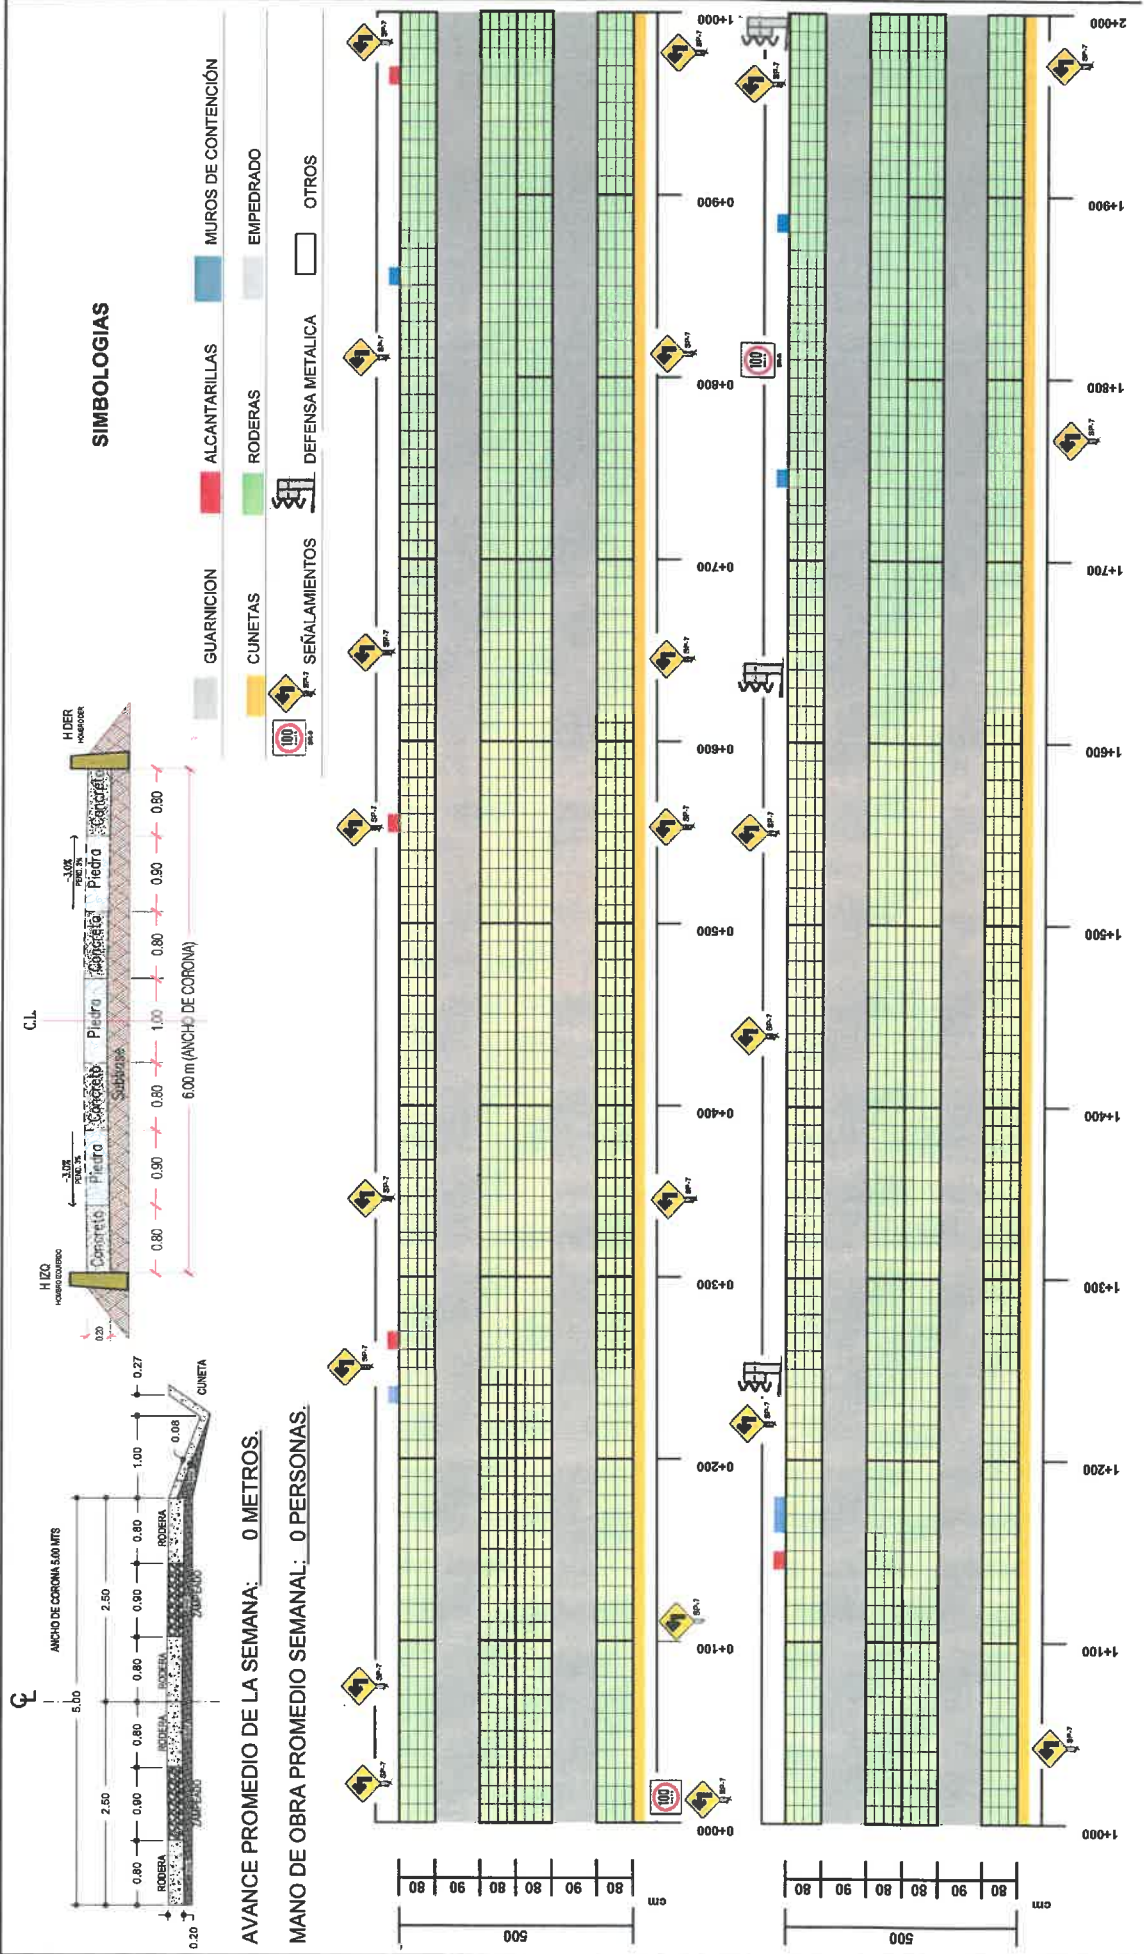


SIMBOLOGIAS

- GUARNICIÓN
- ALCANTARILLAS
- MUROS DE CONTENCIÓN
- CUNETAS
- RODERAS
- EMPEDRADO
- DEFENSA METALICA
- OTROS

AVANCE PROMEDIO DE LA SEMANA: **0 METROS.**

MANO DE OBRA PROMEDIO SEMANAL: **0 PERSONAS.**





TRANSFORMANDO
GUERRERO
Cobertura del Estado
2021 - 2031



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL**
DEL ESTADO DE GUERRERO

LARGUILLO DE AVANCE FISICO

Formato
6



Estado: **GUERRERO** Municipio: **ACATEPEC**

Nombre del Camino: **BUENAS VISTA-XILOTLANCINGO**


Tramo: **0+000-5+980**

Longitud Total: **5.98 KM**

Meta: **5.98 KM**

Ancho de Corona: **5 Y 6 METROS**

Fecha de reporte: **sep-22** Hoja: **2** de **2**



SIMBOLOGIAS

- GUARNICION
- ALCANTARILLAS
- MUROS DE CONTENCION
- CUNETAS
- RODERAS
- EMPEDRADO
- SEÑALAMIENTOS
- DEFENSA METALICA
- OTROS

AVANCE PROMEDIO DE LA SEMANA: **0 METROS.**

MANO DE OBRA PROMEDIO SEMANAL: **0 PERSONAS.**

