



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
CONSTRUYENDO PARA EL FUTURO  
2018 - 2022

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE ACATEPEC GUERRERO**

SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL**  
DEL ESTADO DE GUERRERO

**SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**  
**PROGRAMA: PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS ARTESANALES**

---

# **INFORME FÍSICO – FINANCIERO TRIMESTRAL**

---



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE ACATEPEC, GRO.  
2021-2024**



**INFORME DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO TRIMESTRAL**

Acatepec, Gro., a 30 de noviembre de 2022

**C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel**  
**Secretaria de la SDUOPOT**  
**PRESENTE**

EL QUE SUSCRIBE C. ROMOALDO DIAZ ROSAS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACATEPEC GUERRERO.


POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **TERCER TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)** DEL CAMINO DENOMINADO: **BUENA VISTA - XILOTLANCINGO**, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 5+980, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÀULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÒN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA**, FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: 6 ALCATARILLAS, 17 MUROS, 2240 ML DE CUNETAS CONCLUIDOS, TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 5.98 KM, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
5.98 KM	5.98 KM	100	24,500,000.00	24,465,700.00	\$12,855,575.31	100

Izquierda			Empedrado Central	Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
5980	5980	5980		5980	5980	5980

**ATENTAMENTE**

  
**PRESIDENCIA**  
**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
**CONSTITUCIONAL**  
**DE ACATEPEC, GRO.**  
**DEPARTAMENTO JUDICIAL DE MORELOS**  
**C. ROMOALDO DIAZ ROSAS**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

  
**ING. NAHUN EDUVIGES MACEDA**  
**SUPERVISOR DE OBRA**



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
1911 - 2011



SECRETARÍA DE  
OBRAS PÚBLICAS Y  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
DEL ESTADO DE GUERRERO

# LARGUILLO DE AVANCE FÍSICO

Formato  
**6**



Estado: **GUERRERO** Municipio: **ACATEPEC**

Nombre del Camino: **BUENAS VISTA-XILOTLANCINGO**



Tramo: **0+000-5+980**

Longitud Total: **5.98 KM**

Meta: **5.98 KM**

Ancho de Corona: **5 y 6 METROS**

Fecha de reporte: **dic-22** Hoja: **1** de **3**

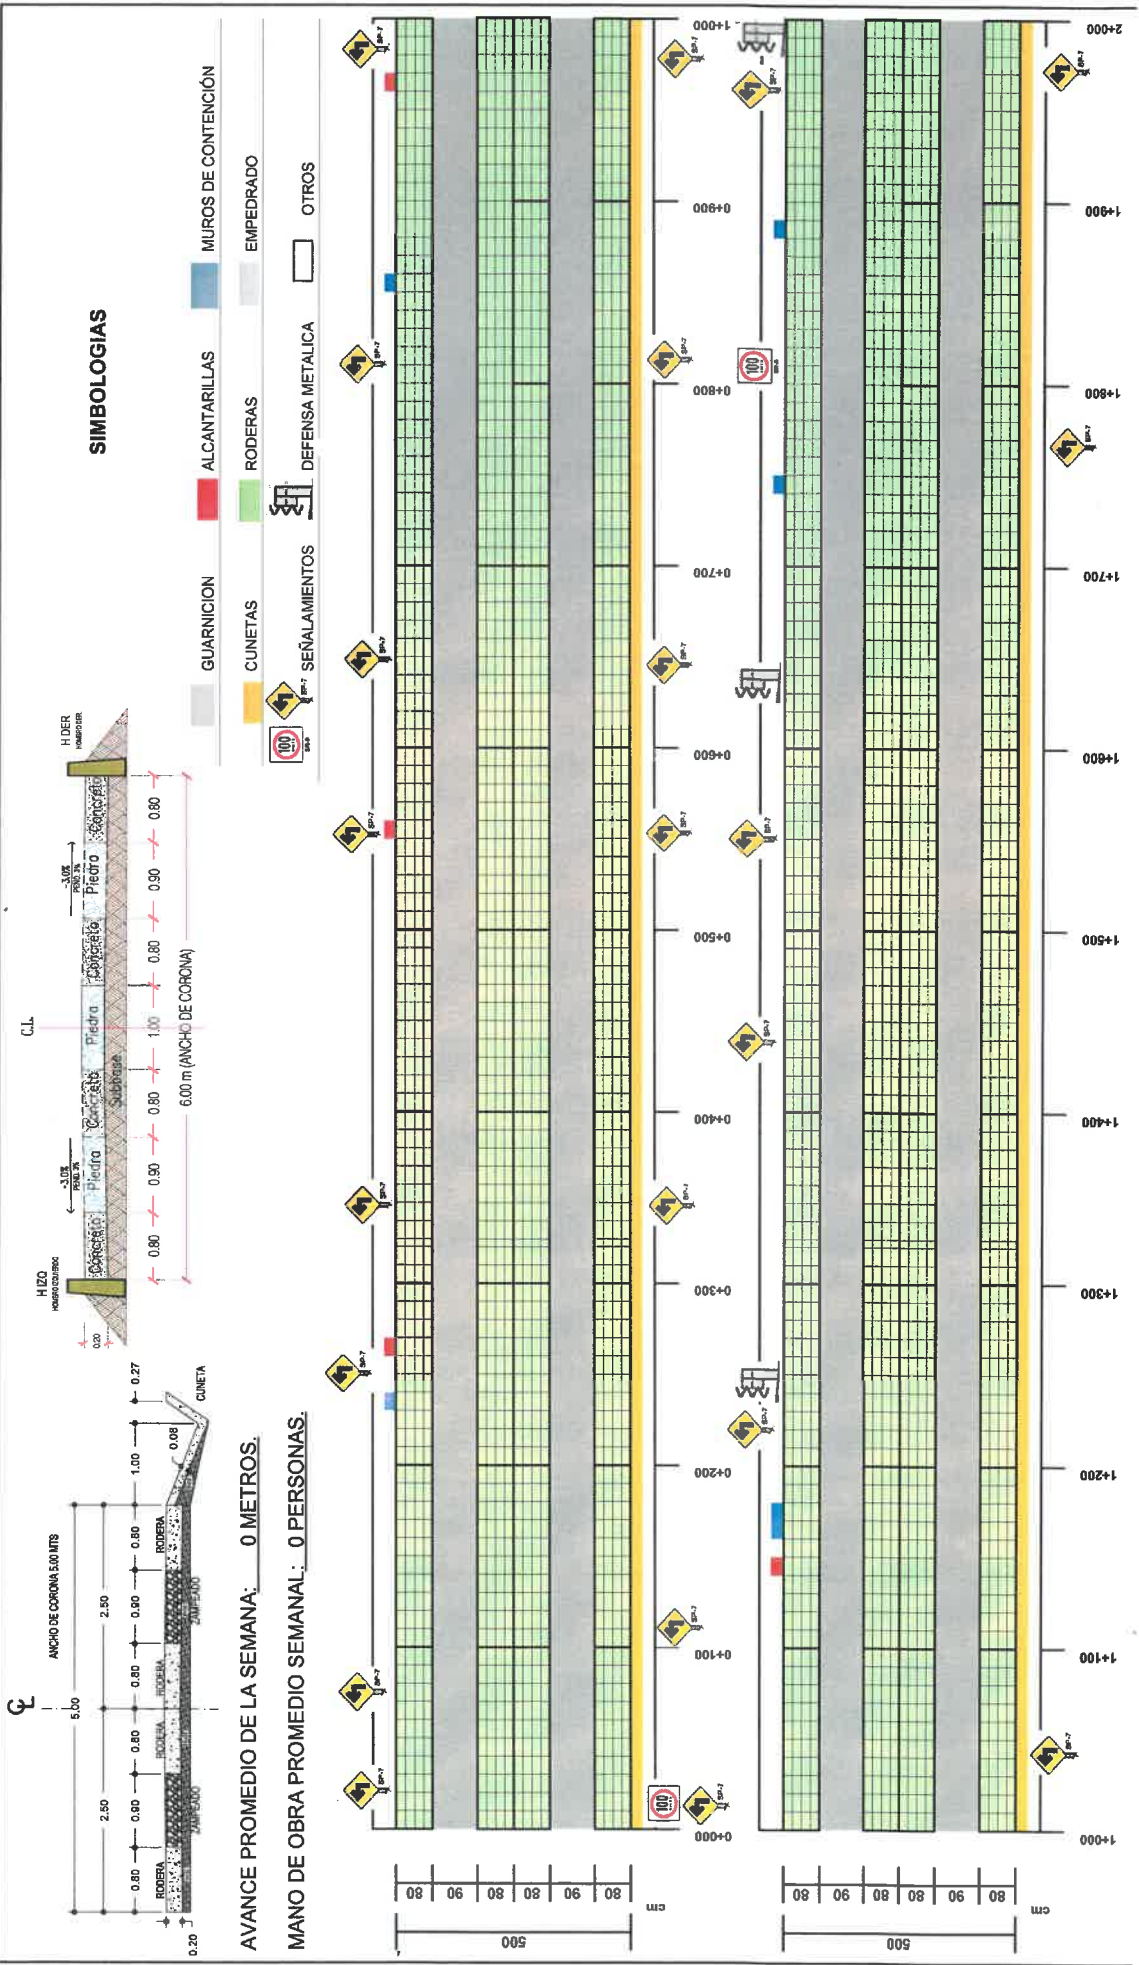

### SIMBOLOGIAS

	GUARNICIÓN		ALCANTARILLAS		MUROS DE CONTENCIÓN
	CUNETAS		RODERAS		EMPEDRADO
	SEÑALAMIENTOS		DEFENSA METALICA		OTROS

AVANCE PROMEDIO DE LA SEMANA: **0 METROS.**

MANO DE OBRA PROMEDIO SEMANAL: **0 PERSONAS.**





TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
COMUNIDAD DEL ESTADO  
2021 - 2027



SECRETARÍA DE  
DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
DEL ESTADO DE GUERRERO

# LARGUILLO DE AVANCE FISICO

Formato  
**6**



Estado: **GUERRERO** Municipio: **ACATEPEC**

Nombre del Camino: **BUENAS VISTA-XILOTLANCINGO**




Tramo: **0+000 -5+980**

Longitud Total : **5.98 KM**

Meja: **5.98 KM**

Ancho de Corona : **5 y 6 METROS**

Fecha de reporte: **dic-22** Hoja: **2** de **3**

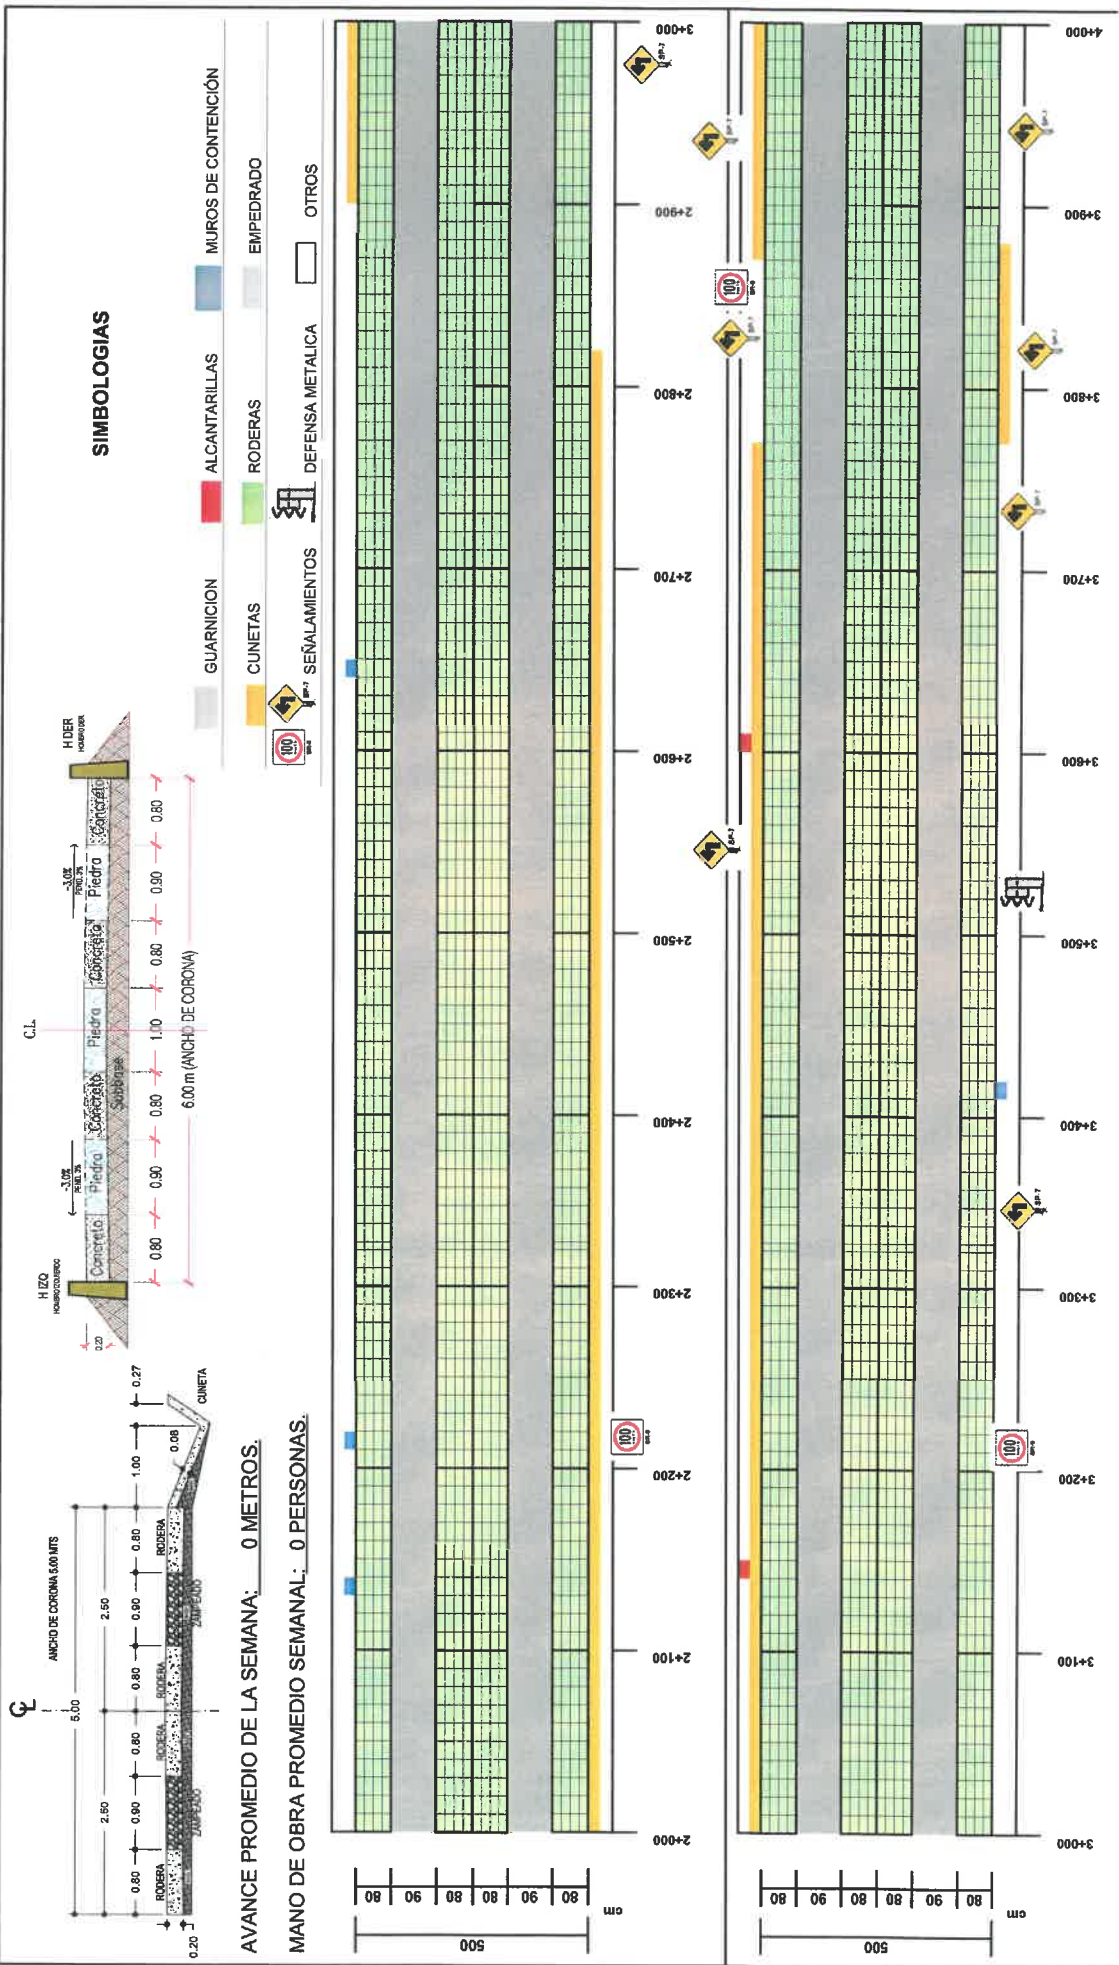

## SIMBOLOGIAS

- |  |               |  |                  |  |                     |
|--|---------------|--|------------------|--|---------------------|
|  | GUARNICION    |  | ALCANTARILLAS    |  | MUROS DE CONTENCIÓN |
|  | CUNETAS       |  | RODERAS          |  | EMPEDRADO           |
|  | SEÑALAMIENTOS |  | DEFENSA METALICA |  | OTROS               |

AVANCE PROMEDIO DE LA SEMANA: **0 METROS.**

MANO DE OBRA PROMEDIO SEMANAL: **0 PERSONAS.**



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2017



SECRETARÍA DE  
DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
DEL ESTADO DE GUERRERO

# LARGUILLO DE AVANCE FISICO

Estado: **GUERRERO** Municipio: **ACATEPEC**

Nombre del Camino: **BUENAS VISTA-XILOTLANCINGO**

Tramo: **0+000-5+980**

Longitud Total: **5.98 KM**

Meta: **5.98 KM**

Ancho de Corona: **5 y 6 METROS**

Fecha de reporte: **dic-22** Hoja: **3** de **3**

