



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
DESARROLLO URBANO  
OBRAS PÚBLICAS Y  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL



# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACATEPEC GUERRERO

**SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**  
**PROGRAMA: PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES**

---

## INFORME FÍSICO – FINANCIERO TRIMESTRAL

---



005705



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE ACATEPEC, GRO.  
2021-2024**



**INFORME DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO TRIMESTRAL**

Acatepec, Gro., a 31 de diciembre de 2022

**C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel**  
**Secretaría de la SDUOPOT**  
**PRESENTE**

EL QUE SUSCRIBE C. ROMOALDO DIAZ ROSAS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACATEPEC GUERRERO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **SEGUNDO TRIMESTRE (OCTUBRE – DICIEMBRE)** DEL CAMINO DENOMINADO: **CRUCERO MIRADOR - EL MIRADOR**, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 0+720, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA**, FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: (2) ALCANTARILLA TIPO LOSA, (1) MUROS DE CONTENCIÓN, (280) DE GUARNICION Y (336) ML DE CUNETAS CONCLUIDOS, TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 0.720 KM, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
0.72 KM	0.720 KM	100	\$2,940,000.00	\$2,935,884.00	\$1,175,475.12	40

Izquierda			Empedrado Central	Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
720	720	720		720	720	720



**C. ROMOALDO DIAZ ROSAS**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**ATENTAMENTE**



**ING. JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ CUEVAS**  
**SUPERVISOR DE OBRA**

005710



# LARGUILLO DE AVANCE FISICO

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL



GOBIERNO DEL ESTADO GUERRERO



Municipio: ACATEPEC

Estado: GUERRERO

Nombre del Camino: CRUCERO EL MIRADOR-MIRADOR


Tramo: 0+000-0+720

Longitud Total: 0.72 KM

Meta: 0.72 KM

Ancho de Corona: 5 METROS

Fecha de reporte: dic-22 Hoja: 1 de 1




AVANCE PROMEDIO DE LA SEMANA: 50 METROS.

MANO DE OBRA PROMEDIO SEMANAL: 14 PERSONAS.

### SIMBOLOGIAS

- GUARNICION
- ALCANTARILLAS
- MUROS DE CONTENCIÓN
- CUNETAS
- RODERAS
- EMPEDRADO
- SEÑALAMIENTOS
- DEFENSA METALICA
- OTROS

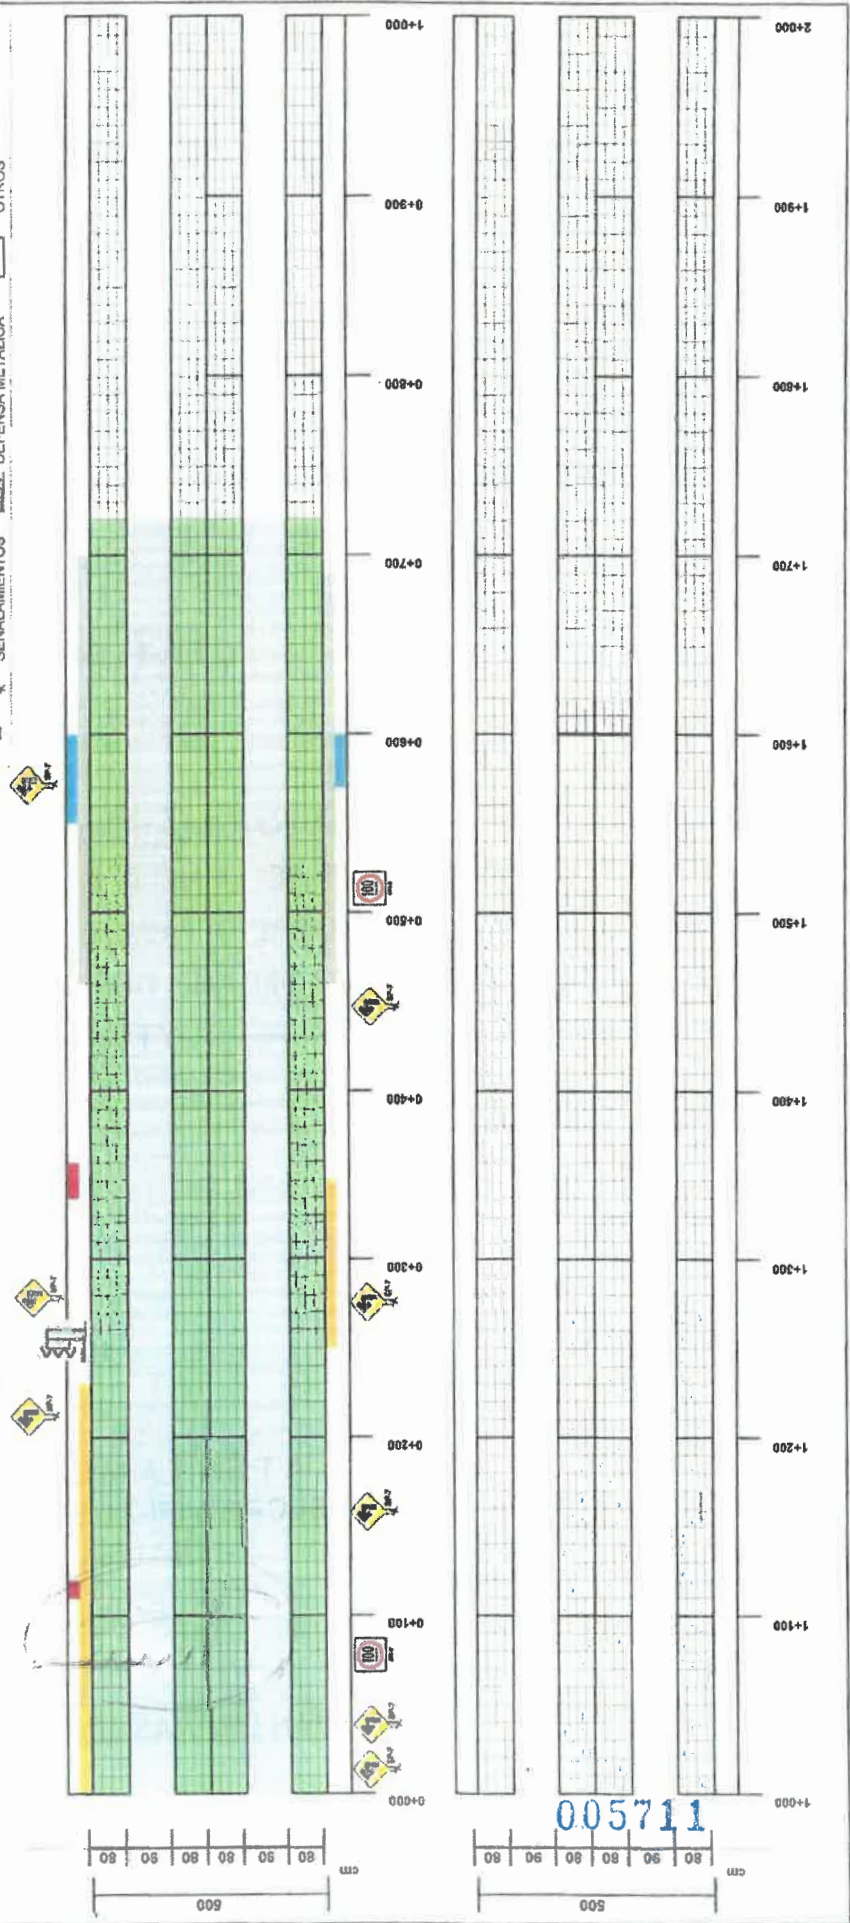

005711
