



TRANSFORMANDO
GUERRERO
DESARROLLO URBANO
OBRAS PÚBLICAS Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACATEPEC GUERRERO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PROGRAMA: PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES

INFORME FÍSICO – FINANCIERO TRIMESTRAL



005705



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE ACATEPEC, GRO.
2021-2024**



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO TRIMESTRAL

Acatepec, Gro., a 30 de septiembre de 2022

C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel
Secretaría de la SDUOPOT
PRESENTE

EL QUE SUSCRIBE C. ROMOALDO DIAZ ROSAS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACATEPEC GUERRERO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **SEGUNDO TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE)** DEL CAMINO DENOMINADO: **CRUCERO MIRADOR - EL MIRADOR**, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 0+720, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÀULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA**, FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: (1) ALCANTARILLA TIPO LOSA, (1) MUROS DE CONTENCIÓN, (280) DE GUARNICION Y (336) ML DE CUNETAS CONCLUIDOS, TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 0.567 KM, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
0.72 KM	0.567 KM	79	\$2,940,000.00	\$1,762,236.00	\$601,183.82	21

Izquierda			Empedrado Central	Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
567	567	567		567	567	567

ATENTAMENTE

C. ROMOALDO DIAZ ROSAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ CUEVAS
SUPERVISOR DE OBRA

005708



TRANSFORMANDO
GUERRERO
COMO UNO DEL ESTADO
4931 - 3077



ORGANISMO DE DESARROLLO URBANO,
CARRILAS PUBLICAS Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DEL ESTADO DE GUERRERO

LARGUILLO DE AVANCE FISICO

Formato
6



Estado: **GUERRERO** Municipio: **ACATEPEC**

Nombre del Camino: **CRUCERO EL MIRADOR-MIRADOR**

Tramo: **0+000 -0+720**


Longitud Total: **0.72 KM**

Meta: **0.72 KM**

Ancho de Corona: **5 METROS**

Fecha de reporte: **sep-22**


Hoja: **1** de **1**



AVANCE PROMEDIO DE LA SEMANA: **50 METROS.**
MANO DE OBRA PROMEDIO SEMANAL: **14 PERSONAS.**

SIMBOLOGIAS

- GUARNICION
- ALCANTARILLAS
- MUROS DE CONTENCIÓN
- CUNETAS
- RODERAS
- EMPEDRADO
- SEÑALAMIENTOS
- DEFENSA METALICA
- OTROS

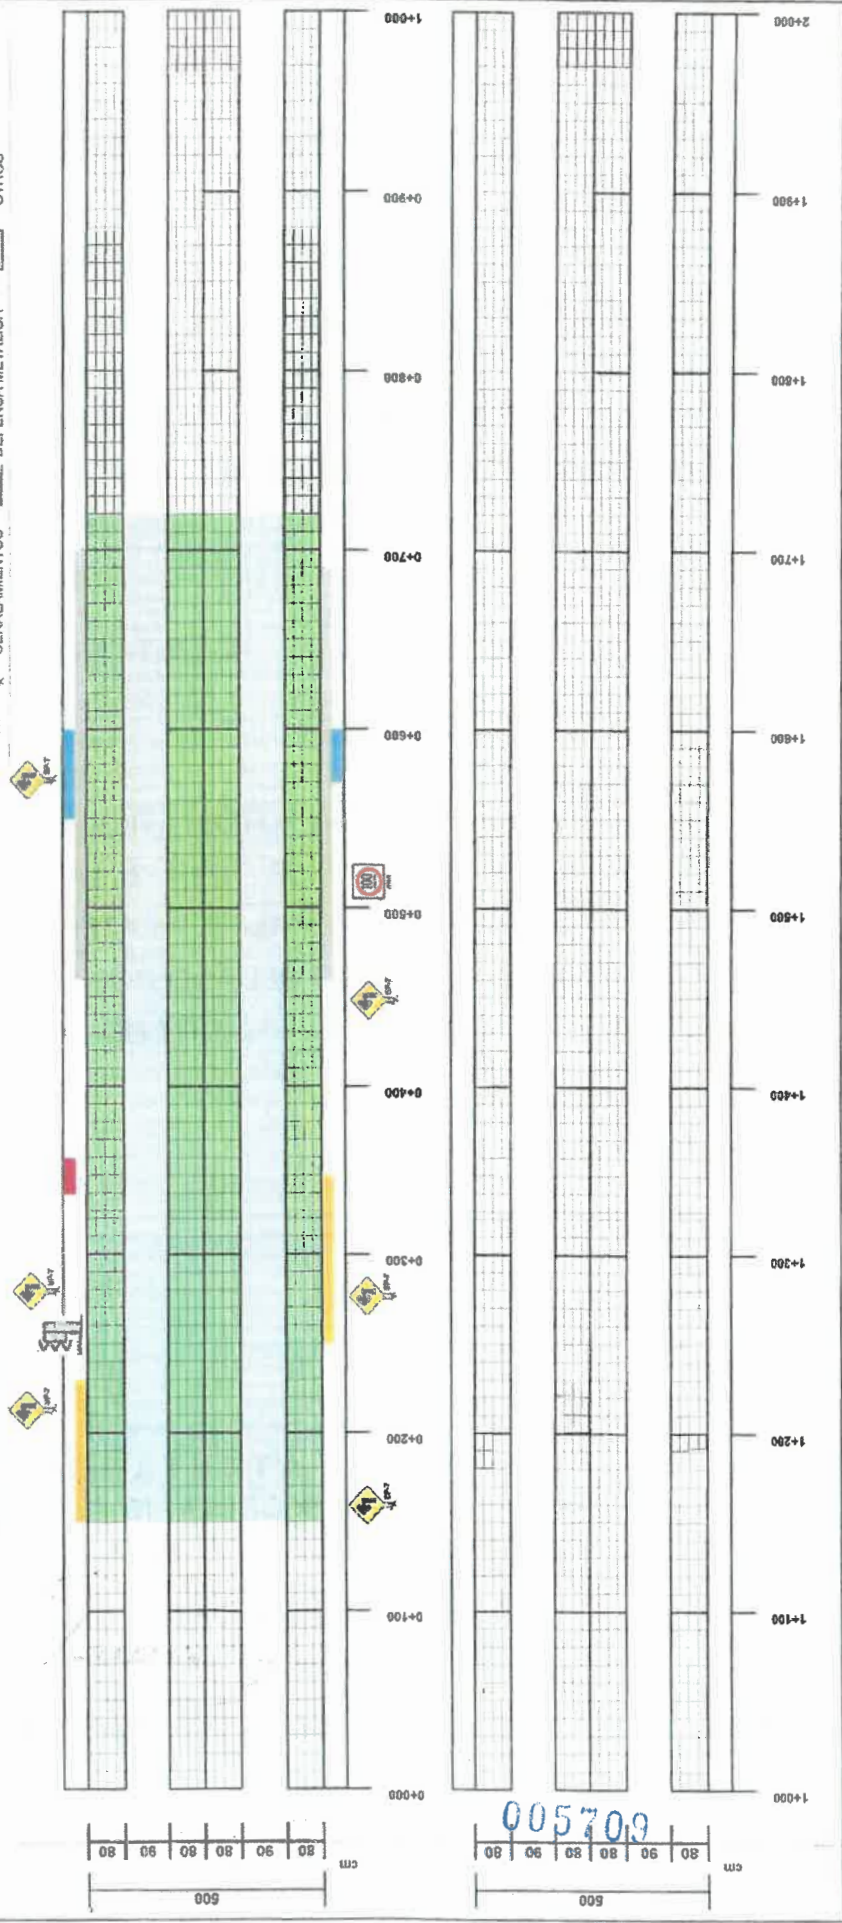

005703
