



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACATEPEC GUERRERO



SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PROGRAMA: PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS ARTESANALES

INFORME FÍSICO – FINANCIERO TRIMESTRAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACATEPEC, GRO. 2021-2024



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO TRIMESTRAL

Acatepec, Gro., a 31 de diciembre de 2022

C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel
Secretaria de la SDUOPOT
PRESENTE

EL QUE SUSCRIBE C. ROMOALDO DIAZ ROSAS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACATEPEC GUERRERO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **TERCER TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)** DEL CAMINO DENOMINADO: **MESON ZAPATA - LOMA TUZA**, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+268, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA**, FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: 3 ALCANTARILLA TIPO LOSA, 2260 ML DE CUNETAS, 640 ML DE GUARNICION, 3268 ML DE EMPEDRADO Y RODERAS CONCLUIDOS, TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 3.268 KM, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
3.268 KM	3.268 KM	100	12,740,000.00	12,740,000.00	\$2,598,644.90	100

Izquierda			Empedrado Central	Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
3268	3268	3268		3268	3268	3268

ATENTAMENTE

C. ROMOALDO DIAZ ROSAS
PRESIDENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL
DE ACATEPEC, GRO.
DISTRITO JUDICIAL
DE MORELOS

ARQ. URB. XITLALIT ORNELAS MONDRAGON
SUPERVISOR DE OBRA



TRANSFORMANDO
GUERRERO
2011 - 2017



SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DEL ESTADO DE GUERRERO

LARGUILLO DE AVANCE FISICO

Formato
6



Estado: **GUERRERO** Municipio: **ACATEPEC**

Nombre del Camino: **MESON ZAPATA-LOMA TUZA**


Tramo: **0+000-3+268**

Longitud Total: **3.268 KM**

Meta: **3.268 KM**

Ancho de Corona: **5 METROS**

Fecha de reporte: **dic-22** Hoja: **1** de **2**




AVANCE PROMEDIO DE LA SEMANA: **104 METROS.**

MANO DE OBRA PROMEDIO SEMANAL: **42 PERSONAS.**

SIMBOLOGIAS

	GUARNICION		ALCANTARILLAS		MUROS DE CONTENCION
	CUNETAS		RODERAS		EMPEDRADO
	SEÑALAMIENTOS		DEFENSA METALICA		OTROS

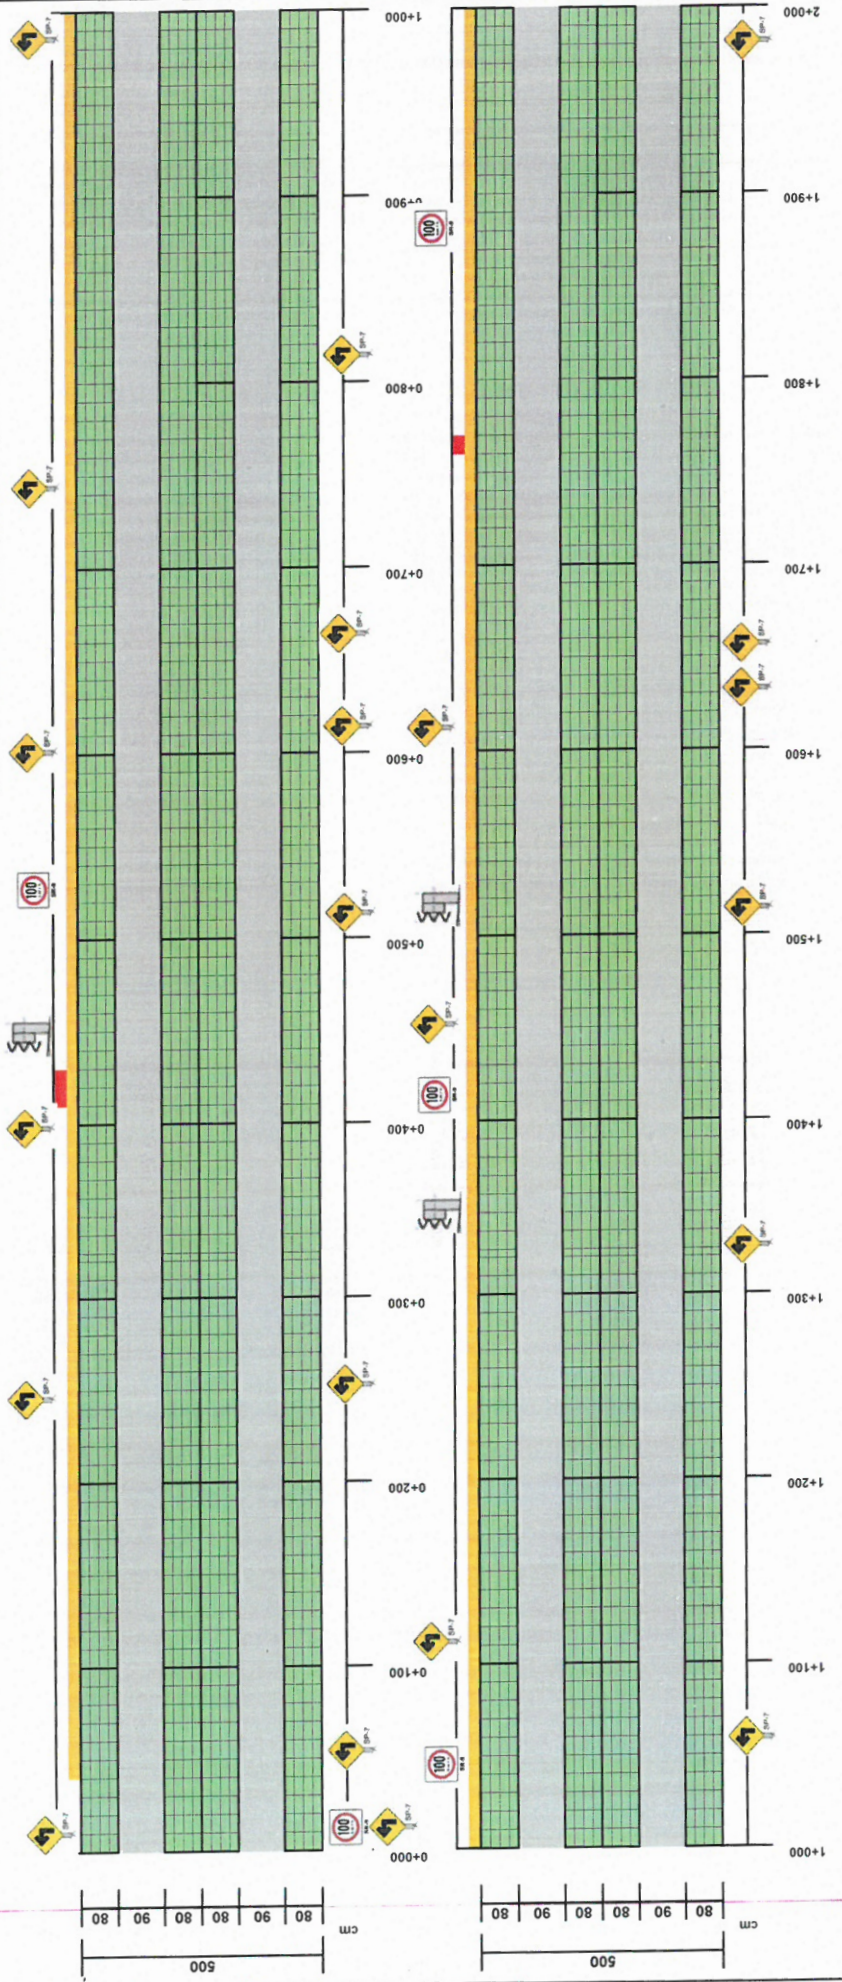



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1931 - 1937



SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DEL ESTADO DE GUERRERO

LARGUILLO DE AVANCE FÍSICO

Formato
6



Estado: **GUERRERO** Municipio: **ACATEPEC**

Nombre del Camino: **MESON ZAPATA-LOMA TUZA**


Tramo: **0+000 - 3+268**

Longitud Total: **3.268 KM**

Meta: **3.268 KM**

Ancho de Corona: **5 METROS**

Fecha de reporte: **dic-22** Hoja: **2** de **2**



AVANCE PROMEDIO DE LA SEMANA: **104 METROS.**

MANO DE OBRA PROMEDIO SEMANAL: **42 PERSONAS.**

SIMBOLOGIAS

- GUARNICION
- ALCANTARILLAS
- MUROS DE CONTENCIÓN
- CUNETAS
- RODERAS
- EMPEDRADO
- ⚠ SEÑALAMIENTOS
- 🚧 DEFENSA METALICA
- OTROS

